

くさび緊結式足場【 Lock series・Lock series-FS 】点検チェックリスト

点 検 日 時	令和 年 月 日 () am/pm : ~ :			元請確認印欄
元 方 事 業 者 名				
現 場 名 / 工 事 名				
点 検 工 区				
点 検 理 由	組立て後・変更後・悪天候後・地震後・一部解体後・その他()			
点 検 者	会社名		氏名	印

専用足場

仮設機材名 該当するものにチェックしてください。					
<input type="checkbox"/> Lock series(ロックシリーズ) <input type="checkbox"/> Lock series-FS(ロックシリーズ エフエス)					
分類	点検項目		点 検 内 容	判定	備考
基礎	基礎の状態	1	地盤面は安定した状態にあるか (目視による)	良 否	
	敷板、敷角	2	地面上に建てる場合、敷板、敷角を使用しているか	良 否	
基礎との固定状態	ジャッキベース類	3	ベースは敷板、敷角に正しく固定されているか	良 否	
		4	ジャッキベース類のレベルは正しいか	良 否	
支柱とジャッキベース	ジャッキベース	5	支柱は正しくジャッキベースに差し込まれているか	良 否	
		6	ジャッキハンドルと支柱下端の間に遊びはないか	良 否	
滑動防止	根がらみ	7	桁方向に2スパン以上根がらみのないスパンがないか	良 否	
		8	根がらみは直角2方向に取付けられているか	良 否	
		9	根がらみ用布材のくさびは正しく打ち込まれているか	良 否	
支柱の連結	抜け止め処置	10	支柱のロックピンが確実にロックされているか	良 否	
支柱の間隔	支柱	11	支柱の設置間隔は指定通りか	良 否	
作業床	床付き布わく	12	指定通りの幅の床付き布わくが設置されているか	良 否	
		13	つかみ金具の外れ止めはロックされているか	良 否	
		14	床材間の隙間は3cm以下であるか	良 否	
布材、ブラケット等	設置状態	15	くさび、又はくさび矢が確実に打ち込まれているか	良 否	
		16	部材緊結部と支柱緊結部との間に隙間はないか	良 否	
		17	布材等の設置位置は指定通りか	良 否	
先行手すり	設置状態	18	設置位置は指定通りか	良 否	
		19	支柱緊結部と先行手すりの下部緊結部接合部の高さは揃い、くさびは正しく打ち込まれているか	良 否	
		20	1層目先行手すりを使用しない場合、3スパン以下ごとに筋かいが取付けられているか	良 否	
躯体との固定	壁つなぎ	21	垂直水平方向とも指定通りの間隔で設置されているか	良 否	
		22	躯体側、足場側ともに堅固な位置に正しく固定されているか	良 否	
昇降設備	階段等	23	安全に昇降できる昇降設備が設けられているか	良 否	
		24	手すり、中さん及び階段開口部手すりは設置されているか	良 否	
		25	階段を連続して設置する場合は2層以下毎に踊り場を設けているか	良 否	
開口部	梁わく等	26	梁わくを用いた開口の高さは3層以下か	良 否	
		27	梁わくの外方1スパンには最下層から梁わくの高さまで各層両横面に先行手すりが設置されているか	良 否	
		28	梁わくの両端支持部の支柱には壁つなぎが設けられているか	良 否	
		29	梁わくを支持する支柱から外方に1スパン以上設置されているか	良 否	
		30	2枚の梁わく間の水平面に床付き布わくを設けているか	良 否	
安全設備	転落・墮落防護工	31	転落・墮落のおそれがある場所に、手すりや幅木、安全ネット等が設置されているか	良 否	
外観検査	垂直方向	32	支柱は垂直に組みあがっているか	良 否	
	水平方向	33	通りや水平は正しく出ているか	良 否	
	不良部材	34	著しい変形や破損のある不良部材を使用していないか	良 否	
最終確認	組立図	35	部材の組み忘れはないか	良 否	
		36	組立図通りに部材の配置、取付けが行われているか	良 否	

注意) この点検は、今後の安全を保障するものではありません。




Ver.20240330

点検時の注意ポイント (Lock series・Lock series-FS)


支柱

10. 支柱のロックピンが確実にロックされているか

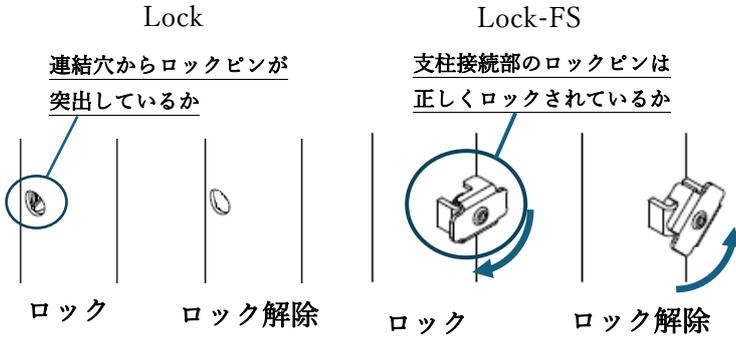


先行手すり

19. 支柱緊結部と先行手すりの下部緊結部接合部の高さは揃い、くさびは正しく打ち込まれているか

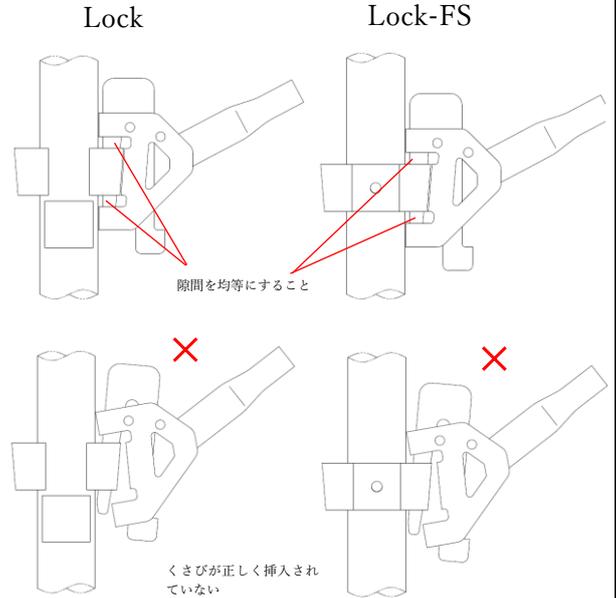


布材、
ブラケット等

16. 部材緊結部と支柱緊結部との間に隙間はないか

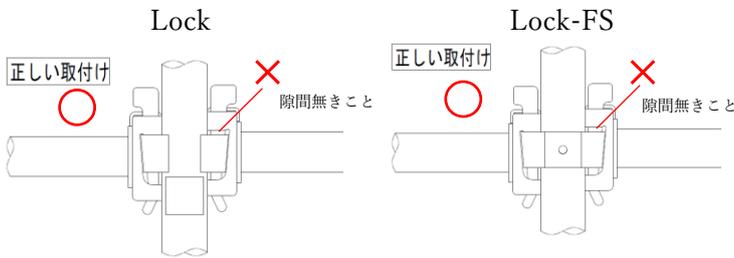

安全設備

31. 転落・墮落のおそれがある場所に、手すりや幅木、安全ネット等が設置されているか

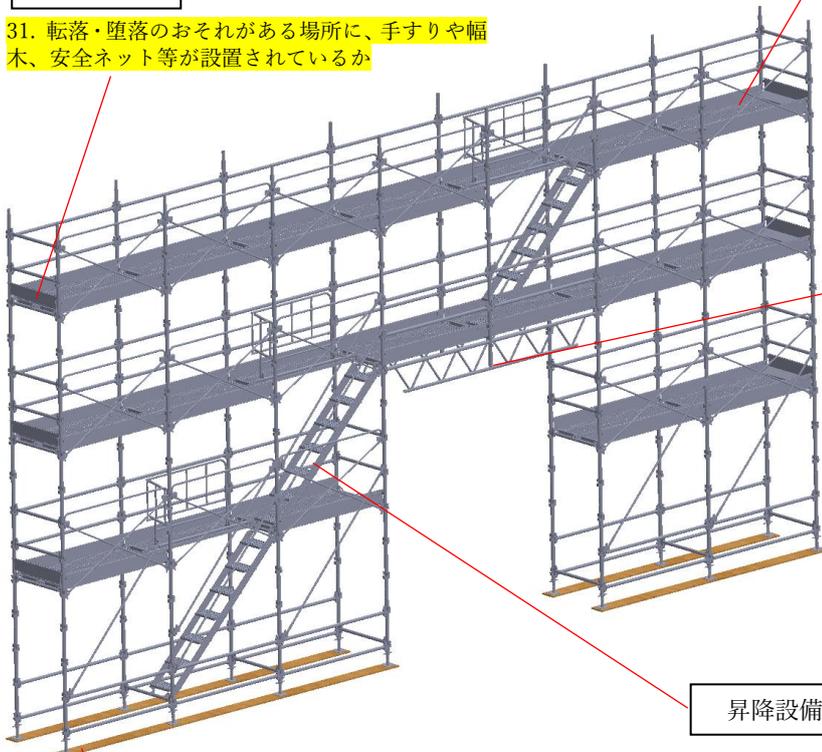

床付き布わく

13. つかみ金具の外れ止めはロックされているか
14. 床材間の隙間は 3 cm 以下であるか



開口部

27. 梁わくの外方 1 スパンには最下層から梁わくの高さまで各層両横面に先行手すりが設置されているか
28. 梁わくの両端支持部の支柱には壁つなぎが設けられているか
29. 梁わくを支持する支柱から外方に 1 スパン以上設置されているか
30. 2 枚の梁わく間の水平面に床付き布わくを設けているか

昇降設備

23. 安全に昇降できる昇降設備が設けられているか
24. 手すり、中さん及び階段開口部手すりは設置されているか
25. 階段を連続して設置する場合は 2 層以下毎に踊り場を設けているか

基礎・基礎との固定状態

2. 地面上に建てる場合、敷板、敷角を使用しているか
3. ベースは敷板、敷角に正しく固定されているか
